

週休2日制現場について

吉岡町

企画財政課 財政室 契約管財係

2024. 10. 24


週休2日とは

工事着手日から工事完成日までの期間に4週
8休以上の現場閉所を行った状態



工事着手日とは

・工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい、…。（県標準仕様書7-66より）

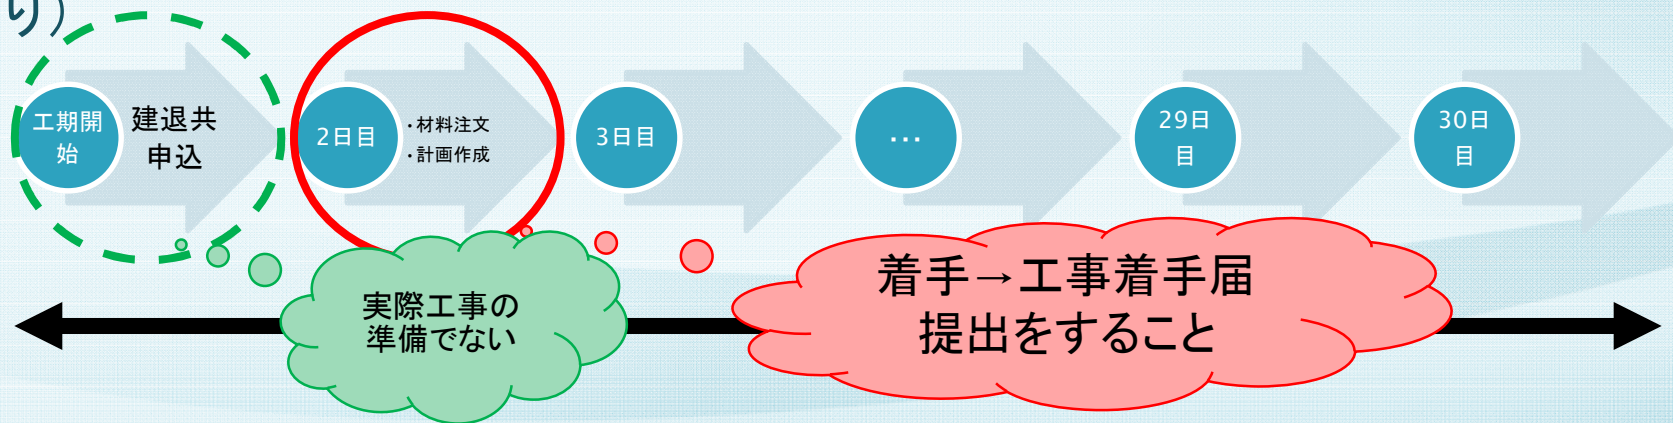

※工事着手：受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、契約書に定める工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。（県標準仕様書7-69より）

工事完成日とは

・受注者は、契約書第31条の規定に基づき、工事完成通知書を監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。(県標準仕様書7-75より)



・受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、以下の各号に掲げる要件を全て満たさなくてはならない。

- (1) 設計図書(追加、変更指示含む)に示される全ての工事が完成
- (2) 契約書第17条第1項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了
- (3) 設計図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備が全て完了
- (4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結
(県標準仕様書7-75より)

現場閉所とは

労働者の休日・休暇に関わらず、現場事務所（当該工事において）での書類作成等の事務作業も含めて、1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態

現場閉所



パトロール



会社の経理



作業内容の
確認




雨休止

現場閉所でない



当該工事の
注文事務



休み



当該工事の
工事（少しでも）



工程変更の
打合せ



看板設置

※巡回パトロールや保守点検等、現場管理上最低限必要な作業は実施してもよい
※降雨、降雪等の自然的な事象による計画外の閉所も含む

週休2日とは

①完全週休2日

週休2日現場閉所実施週／対象週＝100%

※(4週÷4週／月)、原則土日現場閉所

②4週8休現場閉所

週休2日現場閉所実施日／対象日＝28.5%

※(8日÷28日)

①完全週休2日＝週単位



①4週8休現場閉所＝月単位

着手

完成

N月

N+1 月

N+2 月



全ての「月」で
現場閉所率が28.5%以上であること
 $28.5 = 8 \text{ 日} \div 28 \text{ 日}$



確認方法: 割合
現場閉所実施日 ÷ 対象日数


週休2日制現場における注意点

①振替の取扱い

工程表にて現場閉所と定めた日にやむを得ない理由により現場作業を行わなければならない場合→協議により判断

A) 完全週休2日の場合

- ・同一の週内で振り替える
- ・自然的現象による計画外現場閉所は振替ない

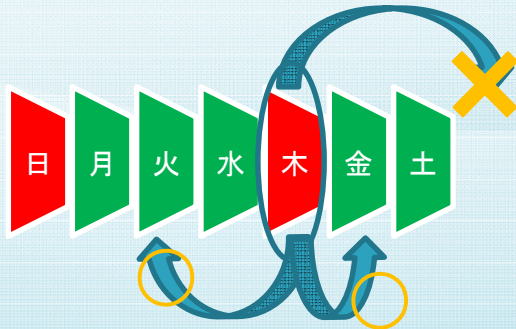


雨の降った日と予定現場閉所日を入れ替えることは不可



B) 4週8休現場閉所の場合

- ・同一の月内で振り替える
- ・自然的現象による計画外現場閉所は振替ない

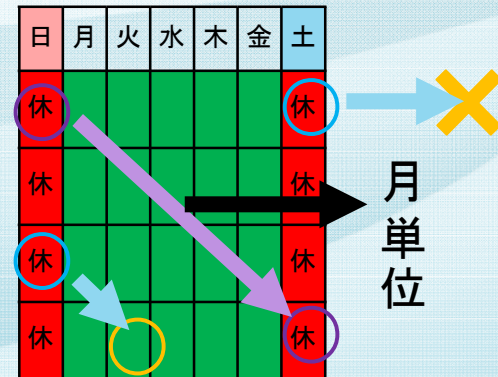

週休2日制現場における注意点

②落札者決定後の手続き

週休2日制現場	手続き概要 手続きのタイミング	通常(週休2日対象外)
○	契約相手方の決定	○
○	週休2日制現場希望意思確認(工事打合せ書) 受注後速やかに	—
○	契約締結 落札後5日以内	○
○	監督員通知 契約時	○
○	代理人・配置技術者選任通知 契約時	○
週休2日制 様式	工程表 週休2日制工程表:着手までに速やかに、通常の工程表:契約締結後10日以内	通常様式
○	着手届 契約後30日以内	○

週休2日制現場における注意点

③履行中・竣工書類の取扱い

○履行中における注意点

- ・工事広報板に週休2日制現場工事である旨を明記すること
文言の例)「この工事は週休2日制に取り組んでいます」等
明記部分の例)工事中標示板上部部、補助標示板上部部 等
※工事広報板等がある場所に、視認性の高い状態で示すこと

○竣工書類における注意点(予定と実施工程がわかる工程表に添付)

- ・出勤簿等の工事現場の閉所状態がわかる書類の提出が必要
- ・就業規則といった企業の休日がわかる書類の提出が必要
※受注者の負担を軽減した書類で確認を行います

※週休2日制現場は、経費補正をしているので必ず検査で状況を確認します

週休2日制現場におけるポイント

①計画的な振替えは協議により認められるが、やむを得ない事情(災害等が考えられるが、自然現象によるものは別)による振替え以外は原則的に認めない

→天候等を注視し、計画的に事前に協議をする(工程管理)

※ただし、自然現象による現場閉所は現場閉所として判断

②当初の工程表で履行ができると判断されている場合、週休2日制現場を理由とした工期延長は、原則認めない。
